ComVive · Plan de puesta en marcha con agentes

Nov 7, 2026 · @Francisco

Resumen

ComVive se construye con un equipo de 10 agentes de IA coordinados por Claude, con el líder del proyecto como dueño del producto y responsable final de cada entrega. El trabajo avanza en 5 etapas, sin plazos fijos: cada etapa termina cuando cumple su hito de aprobación.

- **Líder del proyecto:** define qué se construye, aprueba especificaciones y casos de prueba, y decide qué pasa a producción.
- **Claude (coordinador):** reparte el trabajo entre los agentes, integra sus entregas y mantiene el contexto del proyecto en el repositorio.
- **Agentes:** cada uno con un rol, instrucciones y permisos propios, definidos como archivos en `.claude/agents/` dentro del repositorio.
- **Regla base:** ningún entregable avanza sin pasar por un punto de control del líder del proyecto.

El ritmo lo marcan las aprobaciones y los trámites con terceros, no un calendario.

El equipo de agentes

Cinco agentes trabajan desde el inicio en el diseño; otros cinco se suman cuando empieza la construcción del MVP.


Agente	Responsabilidad	Entregables principales	Entra en
Analista de producto	Convierte necesidades en historias de usuario y reglas de negocio; conoce la Ley 21.442	Historias de usuario, especificaciones por módulo, criterios de aceptación	Etapa 0
Diseñador UX/UI	Flujos, arquitectura de información y sistema visual de ComVive	Mapa de flujos, wireframes, design system, pantallas finales	Etapa 1

Agente	Responsabilidad	Entregables principales	Entra en
Arquitecto de software	Modelo de datos, multi-comunidad, decisiones técnicas	Documento de arquitectura, registros de decisión (ADR), contratos de API	Etapa 0
Ingeniero QA	Apoya al líder del proyecto: casos de prueba desde la especificación, casos borde, pruebas de oro	Plan de pruebas, casos de prueba, set de pruebas de oro financieras	Etapa 0
Revisor crítico	Revisa el trabajo de otros sin haberlo hecho; busca vacíos y contradicciones	Informes de revisión por entregable	Etapa 0
Desarrollador backend	API NestJS, PostgreSQL, motor de gasto común y conciliación	Código backend con pruebas unitarias e integración	Etapa 2
Desarrollador web	Panel de administrador y comité en Next.js	Código web con pruebas E2E (Playwright)	Etapa 2
Desarrollador mobile	App de residente y modo conserjería en Expo	App iOS y Android con pruebas E2E	Etapa 2
Revisor de seguridad	Permisos por rol, aislamiento entre comunidades, datos personales (Ley 21.719)	Revisiones de seguridad, pruebas de aislamiento	Etapa 2
DevOps	Integración continua, ambientes, despliegues y monitoreo	Pipeline CI/CD, ambiente de pruebas y producción, alertas	Etapa 0 (base), Etapa 2 (completo)

Ciclo de trabajo por funcionalidad

Cada módulo sigue el mismo ciclo de 7 pasos, con 3 puntos de control del líder del proyecto: especificación, casos de prueba y validación final.

Cada funcionalidad pasa por tres aprobaciones del líder del proyecto

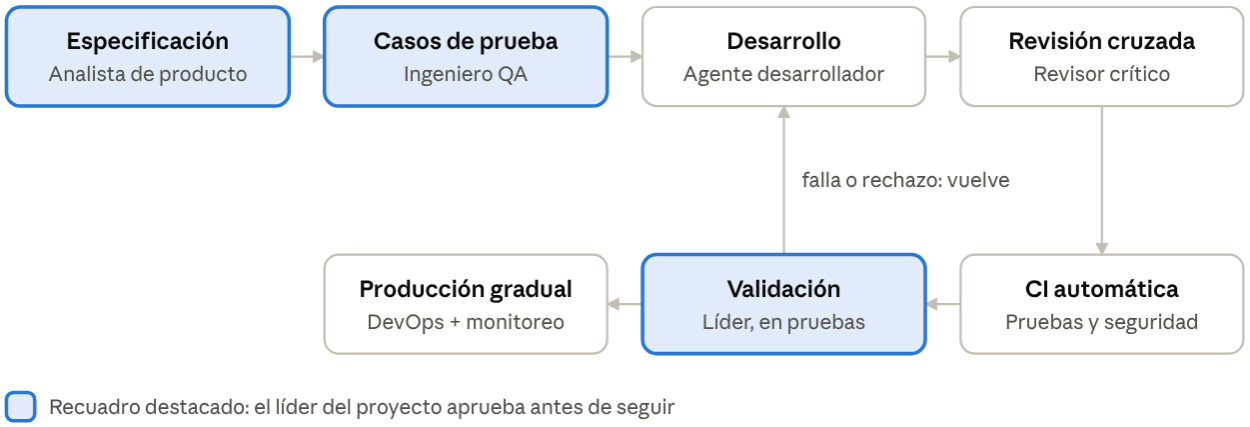

ciclo por funcionalidad · 7 pasos, 3 aprobaciones

Si la integración continua falla o el líder del proyecto rechaza la validación, la funcionalidad vuelve a desarrollo; nada llega a producción sin pasar por los tres controles.

Plan por etapas

El plan tiene 5 etapas; cada una cierra con un hito que aprueba el líder del proyecto.

ComVive avanza en cinco etapas con tres hitos de aprobación



hoja de ruta · 5 etapas, 3 hitos de aprobación

Sin esa aprobación, la etapa siguiente no comienza.

- **Etapa 0, cimientos:** analista, arquitecto, QA, revisor crítico y DevOps base. Repositorio, `CLAUDE.md`, definición de agentes y trámites.
- **Etapa 1, diseño:** se suma el diseñador UX/UI. Flujos, wireframes, design system, arquitectura y especificación del motor de gasto común con sus pruebas de oro.
- **Etapa 2, MVP:** se suman los tres desarrolladores, el revisor de seguridad y DevOps completo. Web de administrador, app de residente, pagos y conciliación.

- **Etapa 3, piloto:** 1 o 2 comunidades reales, corrección de errores y prueba de penetración externa.
- **Etapa 4, lanzamiento:** publicación en App Store y Google Play, venta abierta y monitoreo.

Matriz de responsabilidades

Cada entregable tiene un solo responsable de producirlo y siempre lo aprueba el fundador.

Entregable	Produce	Revisa	Aprueba
Especificación de módulo	Analista de producto	Revisor crítico, Ingeniero QA	Líder del proyecto
Flujos y wireframes	Diseñador UX/UI	Analista de producto, Revisor crítico	Líder del proyecto
Arquitectura y ADR	Arquitecto de software	Revisor crítico, Revisor de seguridad	Líder del proyecto
Casos de prueba y pruebas de oro	Ingeniero QA	Revisor crítico; contador externo para montos	Líder del proyecto
Código de una funcionalidad	Desarrollador (backend, web o mobile)	Revisor crítico, Revisor de seguridad	Líder del proyecto, en ambiente de pruebas
Pipeline y ambientes	DevOps	Arquitecto de software	Líder del proyecto
Paso a producción	DevOps	Ingeniero QA	Líder del proyecto

Estructura del repositorio

Todo el contexto que comparten los agentes vive en un monorepo Git, porque los agentes no recuerdan entre sesiones lo que no está escrito.

```
comvive/
├── CLAUDE.md              # visión, convenciones y reglas no negociables
├── .claude/agents/        # un archivo por agente: rol, instrucciones,
permisos
├── docs/
│   ├── specs/             # especificaciones por módulo
│   ├── adr/               # decisiones de arquitectura
│   ├── design/            # flujos, wireframes, design system
│   └── qa/                # plan de pruebas y casos de oro
├── apps/
│   ├── api/               # NestJS + PostgreSQL
│   ├── web/               # Next.js (administrador y comité)
│   └── mobile/            # Expo (residente y conserjería)
├── packages/
│   └── shared/            # tipos, validaciones y lógica común
└── .github/workflows/     # integración continua
```

Reglas no negociables que van en `CLAUDE.md`:

- Ningún cambio que afecte montos se acepta sin las pruebas de oro en verde.
- Ninguna consulta a la base de datos sin filtro por comunidad.
- Montos en CLP como enteros; nunca decimales para dinero.
- Toda decisión técnica relevante queda en un ADR.

Tareas que hace una persona

Estas tareas no las puede hacer ningún agente y conviene iniciarlas temprano, porque algunas dependen de terceros.

- [ ] Verificar comvive.cl en NIC Chile y la marca en INAPI (clases 9 y 42); registrar dominio y marca
- [ ] Crear la empresa o definir la figura legal para facturar
- [ ] Contratar un contador para validar el motor de gasto común y las pruebas de oro
- [ ] Abrir cuentas de desarrollador en Apple y Google Play
- [ ] Iniciar la afiliación con Transbank (Webpay) u otro proveedor de pagos
- [ ] Crear la cuenta de nube (Google Cloud, región Santiago) y el repositorio en GitHub
- [ ] Revisar con un abogado la Ley 21.442 (asambleas, fondo de reserva) y la Ley 21.719 (datos personales)
- [ ] Conseguir 1 o 2 comunidades piloto para la Etapa 3
- [ ] Contratar una prueba de penetración externa antes del lanzamiento

Riesgos y mitigaciones

El mayor riesgo es un error de cálculo en montos que llegue a producción; las pruebas de oro y la validación del contador son la defensa principal.

Riesgo	Mitigación
Error en el cálculo de gasto común o conciliación	Pruebas de oro validadas por contador, pruebas basadas en propiedades, bloqueo en integración continua
Un usuario ve datos de otra comunidad	Filtro obligatorio por comunidad, pruebas de aislamiento automáticas, revisor de seguridad
Agentes con decisiones inconsistentes entre sí	`CLAUDE.md` y ADR como fuente única; revisor crítico en cada entrega
Pérdida de contexto entre sesiones	Todo en el repositorio; un chat nuevo por etapa o módulo
Consumo de tokens alto	Sumar agentes por etapa, no todos a la vez; conversaciones cortas y enfocadas; especificaciones guardadas en el proyecto
Retrasos externos (Transbank, tiendas de apps)	Iniciar trámites en la Etapa 0
Errores que escapan a las pruebas	Monitoreo, alertas, despliegue gradual y vuelta atrás rápida

Próximos pasos

La Etapa 0 parte con tres entregables que Claude puede preparar de inmediato.

1. Redactar `CLAUDE.md` y los archivos de los 5 agentes de diseño, para revisión del líder del proyecto.
2. Crear el repositorio y el esqueleto del monorepo con integración continua básica.
3. Producir el mapa de usuarios y flujos principales, primer entregable de la Etapa 1.

En paralelo, el líder del proyecto inicia los trámites de la sección anterior, partiendo por dominio, marca y Transbank.
